

Comune di Arena Po

Provincia di Pavia


CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Opere di ampliamento in larghezza di strada comunale del Travanino.


COMMITTENTE: Comune di Arena Po

Arena Po, 20/09/2018

Il Tecnico
(Dott. Ing. Diego Boiocchi)

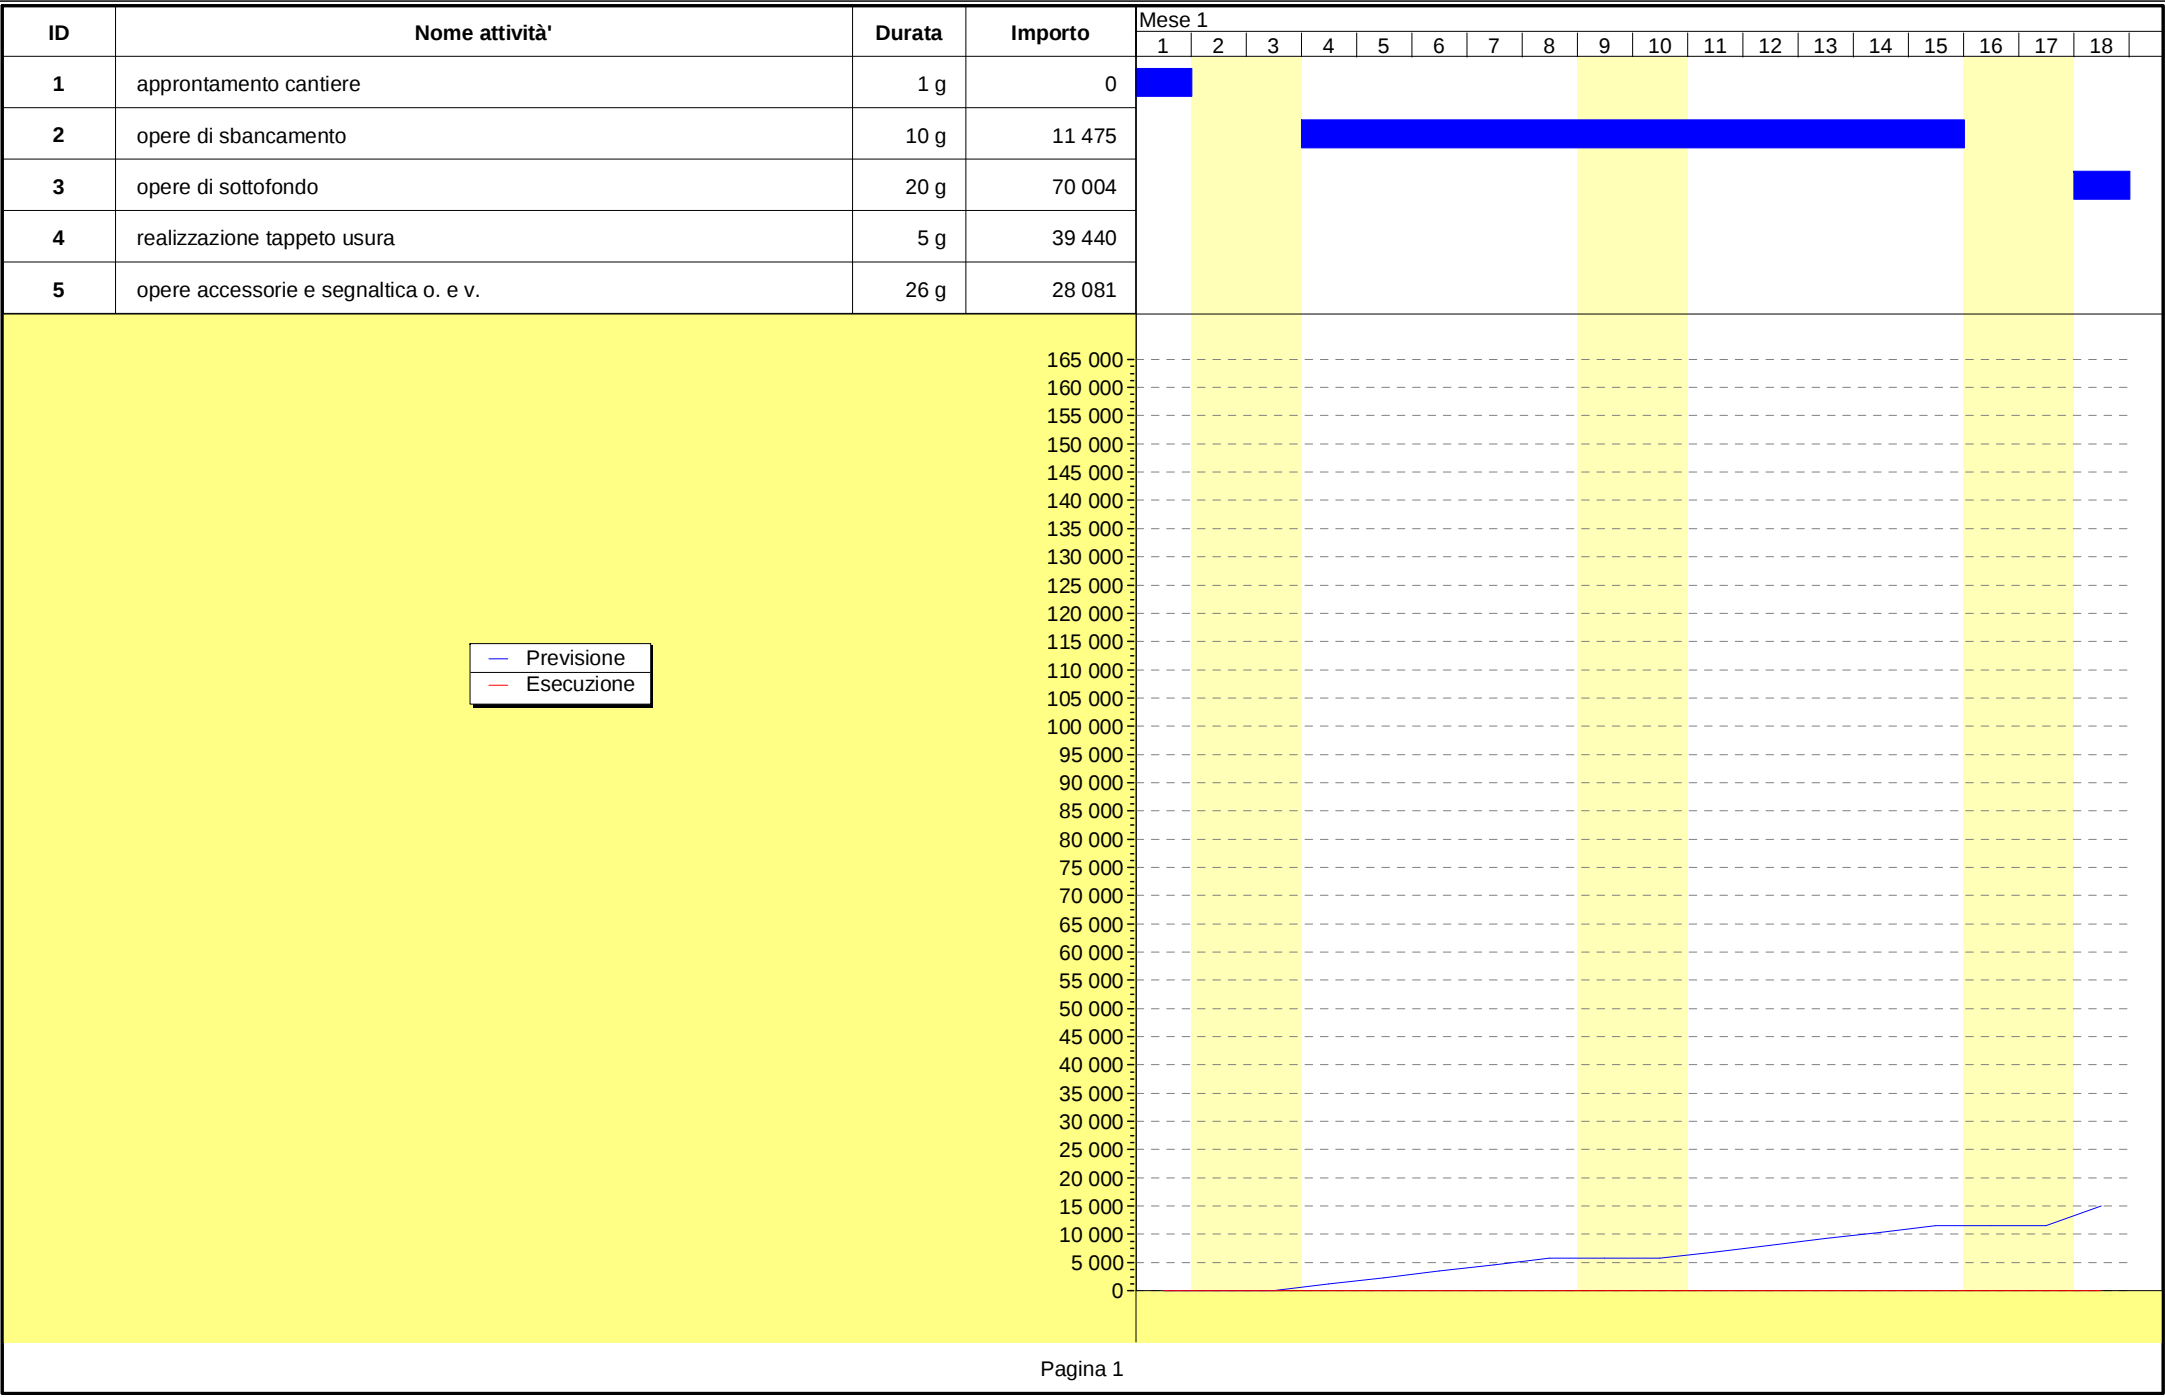

[illegible]

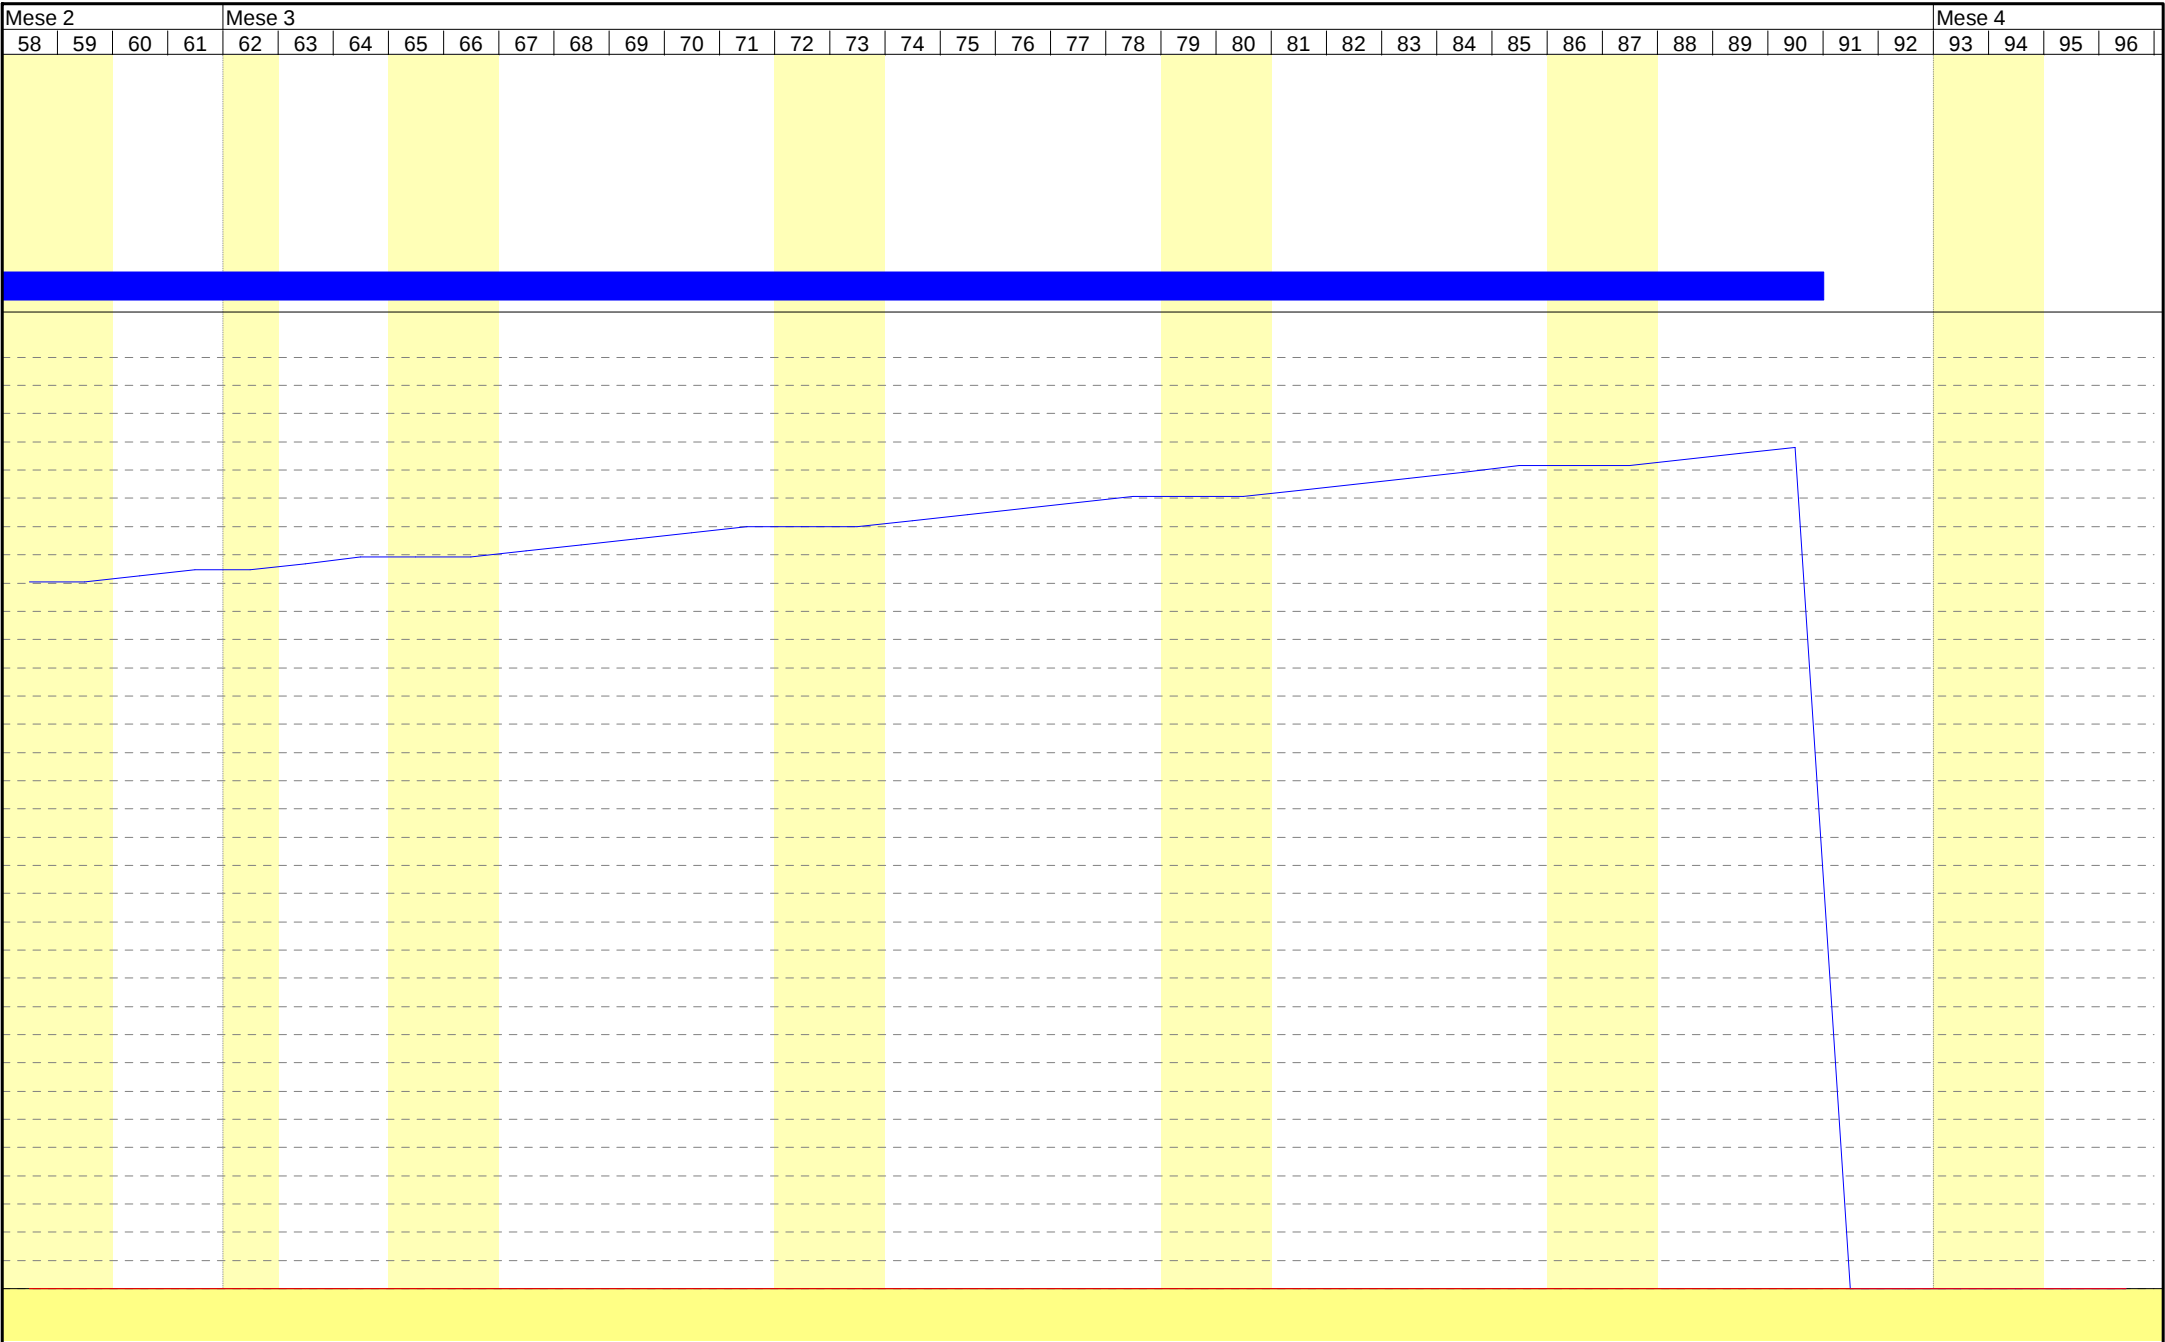

Comune di Arena Po

Provincia di Pavia

Tabella Attività

OGGETTO: Opere di ampliamento in larghezza di strada comunale del Travanino.

COMMITTENTE: Comune di Arena Po

Arena Po, 20/09/2018

Il Tecnico
(Dott. Ing. Diego Boiocchi)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	lire	(%)			Lav.	Tot.
approntamento cantiere	0	0.00	1 gg	1 gg	1	1
opere di sbancamento	11 475	7.70	4 gg	15 gg	10	12
opere di sottofondo	70 004	46.98	18 gg	43 gg	20	26
realizzazione tappeto usura	39 440	26.47	46 gg	50 gg	5	5
opere accessorie e segnaletica o. e v.	28 081	18.85	53 gg	90 gg	26	38

Comune di Arena Po

Provincia di Pavia

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Opere di ampliamento in larghezza di strada comunale del Travanino.

COMMITTENTE: Comune di Arena Po

Arena Po, 20/09/2018

Il Tecnico
(Dott. Ing. Diego Boiocchi)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale lire	Progressivo lire	(%)
4 gg	1 148	1 148	0.77
5 gg	1 148	2 295	1.54
6 gg	1 148	3 443	2.31
7 gg	1 148	4 590	3.08
8 gg	1 148	5 738	3.85
11 gg	1 148	6 885	4.62
12 gg	1 148	8 033	5.39
13 gg	1 148	9 180	6.16
14 gg	1 148	10 328	6.93
15 gg	1 148	11 475	7.70
18 gg	3 500	14 975	10.05
19 gg	3 500	18 475	12.40
20 gg	3 500	21 976	14.75
21 gg	3 500	25 476	17.10
22 gg	3 500	28 976	19.45
25 gg	3 500	32 476	21.80
26 gg	3 500	35 976	24.15
27 gg	3 500	39 477	26.49
28 gg	3 500	42 977	28.84
29 gg	3 500	46 477	31.19
32 gg	3 500	49 977	33.54
33 gg	3 500	53 477	35.89
34 gg	3 500	56 978	38.24
35 gg	3 500	60 478	40.59
36 gg	3 500	63 978	42.94
39 gg	3 500	67 478	45.29
40 gg	3 500	70 978	47.64
41 gg	3 500	74 479	49.99
42 gg	3 500	77 979	52.33
43 gg	3 500	81 479	54.68
46 gg	7 888	89 367	59.98
47 gg	7 888	97 255	65.27
48 gg	7 888	105 143	70.57
49 gg	7 888	113 031	75.86
50 gg	7 888	120 919	81.15
53 gg	1 080	121 999	81.88
54 gg	1 080	123 079	82.60
55 gg	1 080	124 159	83.33
57 gg	1 080	125 239	84.05
60 gg	1 080	126 319	84.78
61 gg	1 080	127 399	85.50
63 gg	1 080	128 479	86.23
64 gg	1 080	129 559	86.95
67 gg	1 080	130 639	87.68
68 gg	1 080	131 719	88.40
69 gg	1 080	132 799	89.13
70 gg	1 080	133 879	89.85
71 gg	1 080	134 960	90.58
74 gg	1 080	136 040	91.30

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale lire	Progressivo lire	(%)
75 gg	1 080	137 120	92.03
76 gg	1 080	138 200	92.75
77 gg	1 080	139 280	93.48
78 gg	1 080	140 360	94.20
81 gg	1 080	141 440	94.93
82 gg	1 080	142 520	95.65
83 gg	1 080	143 600	96.38
84 gg	1 080	144 680	97.10
85 gg	1 080	145 760	97.83
88 gg	1 080	146 840	98.55
89 gg	1 080	147 920	99.28
90 gg	1 080	149 000	100.00
